

## Mintavizsgasor megoldása


### Projektötlet adatlap:

<b>1. A projektötletet kidolgozó neve</b>	Manó Óvoda
---	------------


### A tervezett projekt bemutatása

<b>1. A projekt megnevezése</b>	Játszótér építése az óvoda udvarán	
<b>2. A projekt megvalósulási helye (település/kistérség/régió)</b>	Zirc/Zirc/Veszprém	
<b>3. A projekt megvalósítói és a projektben betöltött szerepük</b>	Önkormányzat Zirc Fenntartó Manó Óvoda Zirc pályázó Játszótér Építő Bt. Kivitelező	
<b>4. A projekt illeszkedése valamely fejlesztési programhoz/térségi hatás</b>	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2006. (II.23.) rendelete 1. §-ának (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a hátrányos helyzetű települések megtartó erejének fokozása céljából.	
<b>5. A projekt célja(i)</b>	Játszótér kialakítása az óvoda udvarán, ezzel bővítve a gyermekek mozgásterét, fejlődését.	
<b>6. A projekt célcsoportja</b>	Óvodás-iskolás gyerekek	
<b>7. A projekt rövid bemutatása</b>	Az óvoda által a szerződéshez rendelt játszóeszközök telepítése.	
<b>8. A projekt fő tevékenységeinek bemutatása és azok tervezett időtartama</b>	<b>Fő tevékenységek</b>	<b>Időtartam</b>
	Pályázat megírása	2 nap
	Ajánlattételek kezelése	2 nap
	Döntés	1 nap
	Kivitelezés	2 hét
<b>9. A projekt tervezett költségvetése (ezer Ft):</b> - direkt - nem direkt költségek - már rendelkezésre álló források	Az eszközök megvásárlására, telepítésére 3.000.000 Ft szükséges. Önerő: 500.000 Ft Szponzori juttatások: 430.000 Ft Fennmaradó összeget pályázat útján kívánjuk elérni.	

**Problémafa:**

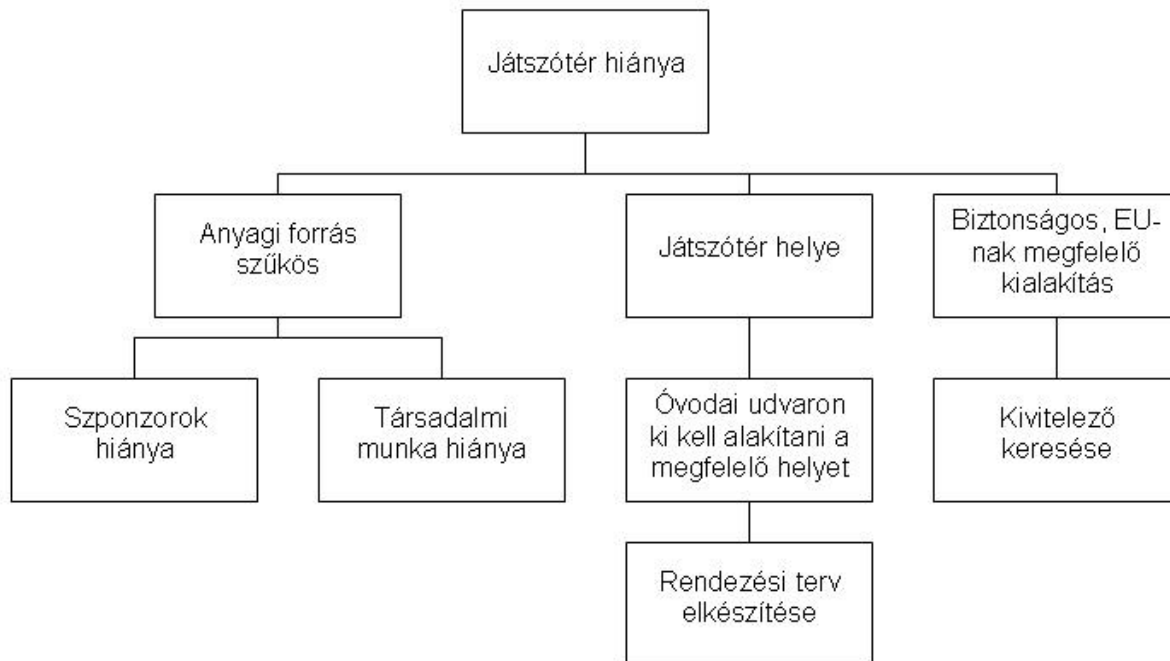

**Célfa:**

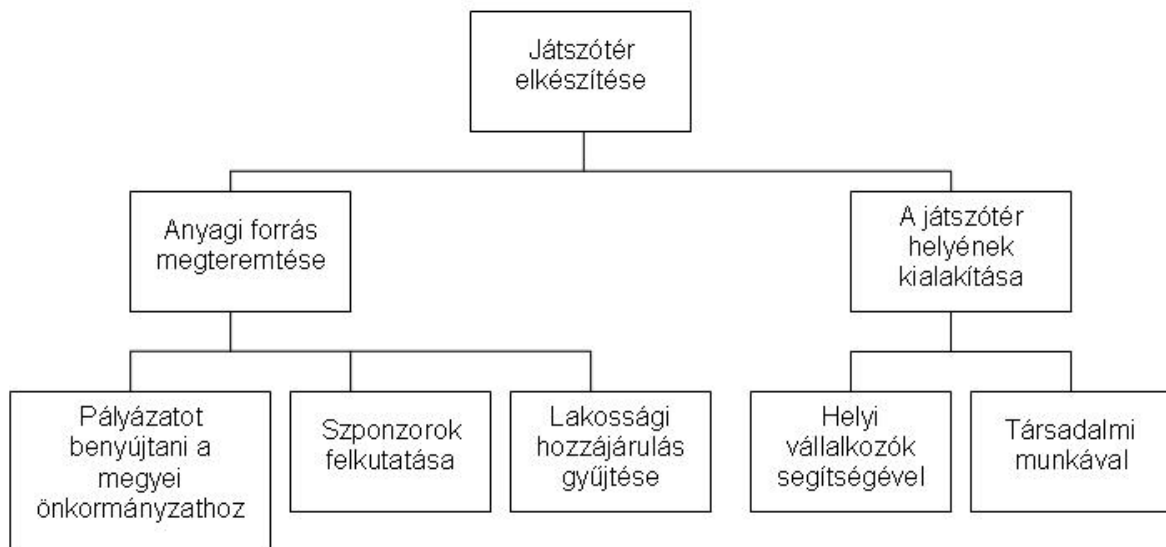

**SWOT-analízis:**

<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
Játszótér helye adott Önerő és szponzori juttatás: kb. 1 000 000 Ft Szülői munkaközösség segítsége Önkormányzati támogatás Gyermeklétszám	Elavult jelenlegi játszótér További pénzforrás hiánya Magas beszerzési költségek
<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
Pályázatok figyelése Szponzorok bevonása Helyi lakosságtól anyagi forrás gyűjtése Helyi vállalkozók munkába való bevonása Társadalmi munka	Megfelelő kivitelező megtalálása Növekvő anyagárak Biztonsági előírások

**A logikai keretmátrix szerkezete**

<b>Leírás</b>	<b>Beavatkozási logika</b>
<b>Átfogó cél</b>	A község életminőségének javítása
<b>Konkrét cél</b>	Óvodai létszám erősítése, gyermekek mozgásterének bővítése
<b>Produktum/kimenetek</b>	Korszerű, az EU követelményeinek megfelelő játszótér kialakítása az óvoda udvarán
<b>Tevékenységek</b>	Az óvoda udvarának kialakítása Játékok beszerzése Szponzorok bevonása Helyi vállalkozók megnyerése Kivitelező megkeresése Játszótér tervének elkészítése

	<b>Beavatkozási logika</b>	<b>Indikátorok</b>	<b>Indikátorok forrásai</b>	<b>Feltételezések</b>
<b>Átfogó cél</b>	Község életminőségének javítása	Kb. 3-5%-os települési létszámnövekedés	Önkormányzati statisztika	
<b>Konkrét cél</b>	Óvodai létszám erősítése, gyermekek mozgásterének bővítése	Kb. 5-10%-os óvodai létszámnövekedés	Önkormányzati statisztika	Források rendelkezésre állnak, Újabb munkahelyek
<b>Produktum/kimenetek</b>	Korszerű, az EU követelményeknek megfelelő játszótér kialakítása az óvoda udvarán	1 db kistorony csúszdával, 2 üléses lengő hinta, 4 db rugós játék 1 db mérleghinta	Használatba vételi engedély, Kivitelezői engedély	Források rendelkezésre állnak, Óvodai személyzet, Szülői munkaközösség
<b>Tevékenységek</b>	Az óvoda udvarának kialakítása, Játékok beszerzése, Szponzorok bevonása, Helyi vállalkozók megnyerése, Kivitelező megkeresése, Játszótér tervének elkészítése	Források: Saját forrás: 930.000 Ft Igényelt támogatás: 2.000.000 Ft Összköltség: kb. 3.000.000 Ft  Humán erőforrások: • Projektmenedzser • Kivitelező	Költségek: .....	Játszótéri eszközök beszerzése, Működési engedély
				Növekvő igény jelentkezik az óvodások és a lakosság részéről az óvodai képzési lehetőségek kihasználására.

**Stakeholder analízis:**

Személyek:

Aki érdekelt a projektben:

- Pályázatiíró: az óvoda vezetője és az önkormányzat munkatársa, tehát az óvoda és a város
- Kivitelező: Játszótér Építő Bt.

Aki befolyásolja a projekt alakulását:

- Kivitelező
- Szponzorok

Akire a projekt kihatással van:

- Óvoda
- Óvodai csoportok
- Város lakói


**Erőforrás-terhelés:**

<input type="checkbox"/> vezető óvónő	304 ó
<i>pályázat megírása</i>	144 ó
<i>árajánlatok kérése</i>	112 ó
<i>pályázat összeállítása</i>	16 ó
<i>fenntartóval kapcsolattartás</i>	8 ó
<i>pályázat beadásának véglegesítése</i>	8 ó
<i>kivitelezővel szerződés kötés</i>	8 ó
<i>pályázat lezárása</i>	8 ó
<input type="checkbox"/> önkormányzat	48 ó
<i>pályázat összeállítása</i>	16 ó
<i>fenntartóval kapcsolattartás</i>	8 ó
<i>pályázat beadásának véglegesítése</i>	8 ó
<i>kivitelezővel szerződés kötés</i>	8 ó
<i>pályázat lezárása</i>	8 ó
<input type="checkbox"/> kivitelező	144 ó
<i>játszótér tervének elkészítése</i>	24 ó
<i>eszközök megrendelése</i>	8 ó
<i>eszközök telepítése, kivitelezés</i>	112 ó

### Tevékenységlista:

		Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők	Erőforrások nevei
1		<input type="checkbox"/> pályázat megírása	18 nap	Hét 07.10.29.	Sze 07.11.21.		vezető óvónő
2		árajánlatok kérése	14 nap	Hét 07.10.29.	Csü 07.11.15.		vezető óvónő
3		pályázat összeállítása	2 nap	Pén 07.11.16.	Hét 07.11.19.	2	vezető óvónő; önkormányzat
4		fenntartóval kapcsolattartás	1 nap	Ked 07.11.20.	Ked 07.11.20.	3	vezető óvónő; önkormányzat
5		pályázat beadásának véglegesítése	1 nap	Sze 07.11.21.	Sze 07.11.21.	4	vezető óvónő; önkormányzat
6		kivitelezővel szerződés kötés	1 nap	Csü 07.11.22.	Csü 07.11.22.	5;1	vezető óvónő; önkormányzat
7		játszóter tervének elkészítése	3 nap	Pén 07.11.23.	Ked 07.11.27.	6	kivitelező
8		eszközök megrendelése	1 nap	Sze 07.11.28.	Sze 07.11.28.	7	kivitelező
9		eszközök telepítése, kivitelezés megkezdése	14 nap	Csü 07.11.29.	Ked 07.12.18.	7;8	kivitelező
10		pályázat lezárása	1 nap	Sze 07.12.19.	Sze 07.12.19.	9	vezető óvónő; önkormányzat

### Gantt-diagram

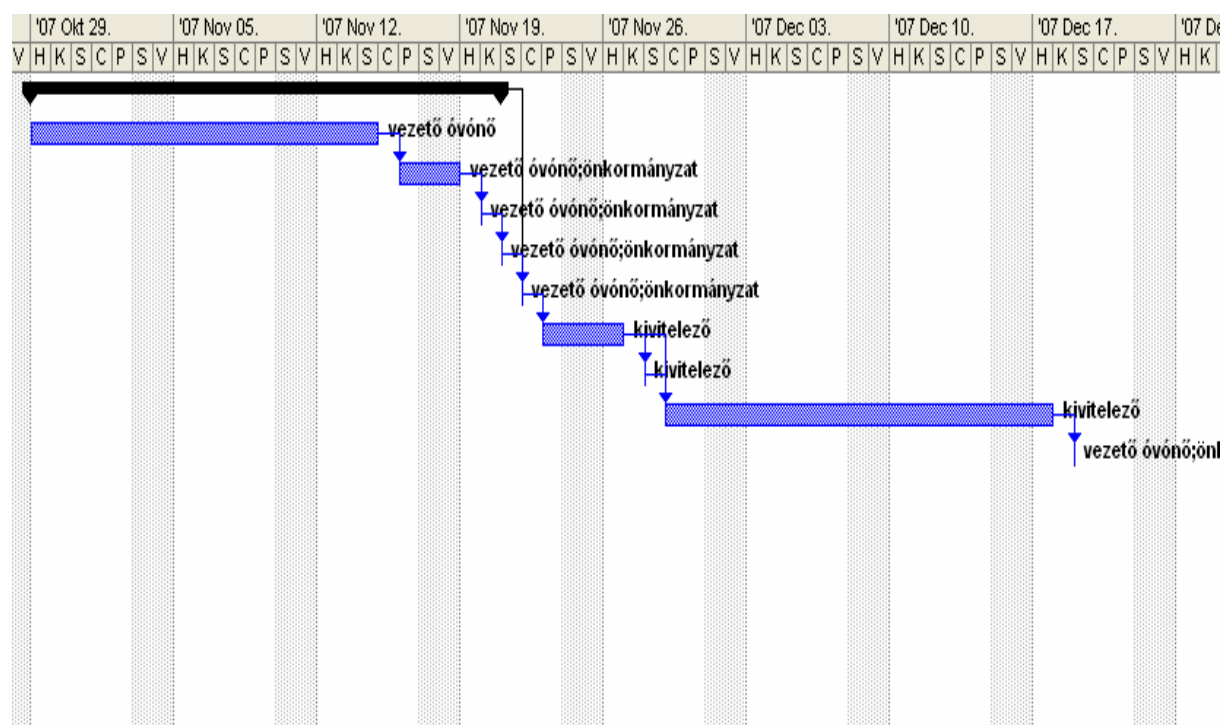

**Költségvetés:**

Költségvetési jelentés, dátum: Pén 07.10.26.  
Projekt

Azonosító	Tevékenység neve	Fix költség	Fix költség felmerülése	Teljes költség
8	eszközök megrendelése	0,00 Ft	Egyenletesen	2 583 000,00 Ft
7	játszótér tervének elkészítése	0,00 Ft	Egyenletesen	133 000,00 Ft
9	eszközök telepítése, kivitelezés	0,00 Ft	Egyenletesen	133 000,00 Ft
2	árajánlatok kérése	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
3	pályázat összeállítása	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
4	fenntartóval kapcsolattartás	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
5	pályázat beadásának véglegesítés	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
6	kivitelezővel szerződés kötés	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
10	pályázat lezárása	0,00 Ft	Egyenletesen	0,00 Ft
		<b>0,00 Ft</b>		<b>2 849 000,00 Ft</b>

**Projektjelentés:**

dátum: Pén 07.10.26.

**Dátumok**

Kezdés:	Hét 07.10.29.	Befejezés:	Sze 07.12.19.
Eredeti kezdés:	Érvénytelen	Eredeti befejezés:	Érvénytelen
Tényleges kezdés:	Érvénytelen	Tényleges befejezés:	Érvénytelen
Kezdés eltérése:	0 nap	Befejezés eltérése:	0 nap

**Időtartam**

Ütemezett:	37,5 nap	Hátralévő:	37,5 nap
Eredeti:	0 nap?	Tényleges:	0 nap
Eltérés:	37,5 nap	Készültségi szint:	0%

**Munka**

Ütemezett:	496 ó	Hátralévő:	496 ó
Eredeti:	0 ó	Tényleges:	0 ó
Eltérés:	496 ó	Készültségi szint:	0%

**Költségek**

Ütemezett:	2 849 000,00 Ft	Hátralévő:	2 849 000,00 Ft
Eredeti:	0,00 Ft	Tényleges:	0,00 Ft
Eltérés:	2 849 000,00 Ft		

**Tevékenység állapota**

El nem kezdett tevékeny:	10
Folyamatban levő tevéke	0
Kész tevékenységek:	0
Az összes tevékenység:	10

**Erőforrás állapota**

Munka típusú erőforrások:	3
Túlterhelt, munka típusú erőforr	1
Anyag típusú erőforrások:	0
Az összes erőforrás:	4

## Kritikus út:

Kritikus tevékenységek, dátum: Pén 07.10.26.  
Projekt1

Azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés
1	pályázat megírása	18 nap	Hét 07.10.29.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
6	kivitelező vel szerződés kötés	BK	0 nap
2	árajánlatok kérése	14 nap	Hét 07.10.29.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
3	pályázat összeállítása	BK	0 nap
3	pályázat összeállítása	2 nap	Pén 07.11.16.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
4	fenntartóval kapcsolattartás	BK	0 nap
4	fenntartóval kapcsolattartás	1 nap	Ked 07.11.20.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
5	pályázat beadásának véglegesítése	BK	0 nap
5	pályázat beadásának véglegesítése	1 nap	Sze 07.11.21.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
6	kivitelező vel szerződés kötés	BK	0 nap
6	kivitelezővel szerződés kötés	1 nap	Csü 07.11.22.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
7	játszótér tervének elkészítése	BK	0 nap
7	játszótér tervének elkészítése	3 nap	Pén 07.11.23.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
8	eszközök megrendelése	BK	0 nap
9	eszközök telepítése, kivitelezés	BK	0 nap
8	eszközök megrendelése	0,5 nap	Sze 07.11.28.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
9	eszközök telepítése, kivitelezés	BK	0 nap
9	eszközök telepítése, kivitelezés	14 nap	Sze 07.11.28.
<i>Azonosító</i>	<i>Követő tevékenység</i>	<i>Típus</i>	<i>Eltérés</i>
10	pályázat lezárása	BK	0 nap
10	pályázat lezárása	1 nap	Ked 07.12.18.
